

# PROGRAMA DE FORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN VIGILANCIA CIUDADANA A DISTANCIA

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

MEJORAMIENTO DE  
LOS SERVICIOS DE

LA LOSA DEPORTIVA  
AA.HH. 20 DE DICIEMBRE,  
DISTRITO DE ILO,  
PROVINCIA DE ILO,  
REGIÓN MOQUEGUA

MOQUEGUA

Las pequeñas  
acciones, generan  
grandes cambios

Con el apoyo de :



**USAID**  
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS  
UNIDOS DE AMÉRICA



# INFORME DE LA VIGILANCIA DE LA OBRA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA LOSA DEPORTIVA DE AA.HH. 20 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA

## ÍNDICE

▶ Introducción	4
▶ Presentación	11
▶ Análisis	16
▶ Conclusiones	20
▶ Recomendaciones	21

Presidente del Directorio

Federico Tenorio Calderón

Coordinador Ejecutivo

Epifanio Baca Tupayachi

Cuidado de edición

Nelly Carrasco

Diseño

[www.digitalworldperu.com](http://www.digitalworldperu.com)

Diagramación y digitalización

Ymagino Publicidad SAC

Con el apoyo:



Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Las opiniones expresadas por los autores no reflejan necesariamente el punto del vista de USAID ni del Gobierno de los Estados Unidos.

# PROGRAMA DE FORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN VIGILANCIA CIUDADANA A DISTANCIA

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

MEJORAMIENTO DE  
LOS SERVICIOS DE

LA LOSA DEPORTIVA  
AA.HH. 20 DE DICIEMBRE,  
DISTRITO DE ILO,  
PROVINCIA DE ILO,  
REGIÓN MOQUEGUA

MOQUEGUA

## Comité de Vigilancia

- ▶ María Eliana Santacruz Huillca
- ▶ Dylan Joy Canto Pari
- ▶ Martiza Lindomira Perca Ortega
- ▶ Juan Alejandro León

Agosto 2020

# INTRODUCCIÓN



---

## OBJETO DE LA VIGILANCIA

---

El comité de vigilancia integrado por: María Eliana Santacruz Huillca, Maritza Lindomira Perca Ortega, Dylan Joy Canto Pari y Juan Alejandro León Palomino por iniciativa propia decidimos realizar la vigilancia a la obra:

“LOSA DEPORTIVA DEL AA.HH. 20 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA”, tomando en cuenta las consideraciones siguientes:

- ▶ Por la destrucción de una losa deportiva que estaba operativa y a la fecha no existe un área recreativa en la zona.
- ▶ Por el tiempo de demora de la culminación del proyecto.
- ▶ Por el incremento del tiempo de ejecución.
- ▶ Por el incremento en el monto del proyecto.

El proceso de vigilancia nos va permitir conocer a plenitud las razones indicadas anteriormente, además de evidenciar la situación real del proyecto a la fecha.

## RECuento HISTÓRICO



Esta losa deportiva fue intervenida el año 2014 por la Municipalidad Provincial de Ilo con la ejecución del mantenimiento pintado. Está plasmado en el documento de la Memoria de Gestión Institucional 2014<sup>1</sup> (pág. 142 y pág. 156).

### Ejecución de los mantenimientos

N°	NOMBRE DEL MANTENIMIENTO	ESTADO DE MANTENIMIENTO
<b>I. MANTENIMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO</b>		
1	Mantenimiento y pintado de la losa deportiva Urb. Garibaldi	Terminado
2	Mantenimiento y pintado del parque y la losa deportiva Villa Pacifico	Terminado
3	Mantenimiento y pintado de la losa deportiva 20 de Diciembre	Terminado
4	Mantenimiento y pintado	En ejecución
<b>II. MANTENIMIENTO DE VÍAS LOCALES</b>		
5	Pintado y demarcación de accesos vehiculares en la ciudad de Ilo	Terminado
6	Parchado de vías y mantenimiento de sardineles — Pampa inalámbrica	Terminado
7	Mantenimiento de bermas y parchado de vías — Cercado y alrededores	Terminado
8	Mantenimiento de pasaje N° 24 Mz. A San Pedro Upis Alto Ilo	Terminado
9	Mantenimiento de pasaje s/n, veredas y sardineles del Jirón Ayacucho y Callao — Centro Urbano	Terminado
<b>III. MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES</b>		
10	Mantenimiento de Plaza N° 02 (Liberación)	Terminado
11	Mantenimiento del parque "El Cobre"	Terminado
12	Mantenimiento y pintado del parque R7- Vista Azul	Terminado
13	Mantenimiento y pintado del parque infantil de la Urb. Garibaldi y áreas anexas	En ejecución
<b>IV. MANTENIMIENTO DE MALECÓN PROVINCIA DE ILO</b>		
14	Pintado de malecón Alto Ilo sector Nylon	Terminado
15	Pintado de malecón Belle Horizonte	Terminado
<b>V. MANTENIMIENTO DE COMEDORES</b>		
16	Mantenimiento de pintado del comedor Los Ángeles	Terminado
17	Mantenimiento de pintado del comedor Nueva Generación	Terminado
18	Mantenimiento de pintado del comedor Keiko Sofia	Terminado
19	Mantenimiento de pintado del comedor Niño de Ayavi	Terminado
<b>VI. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO Y SERVICIOS PÚBLICOS</b>		
21	Mantenimiento de ingreso vehicular al desembarcadero artesanal	En ejecución
<b>VII. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE LAS PLAYAS</b>		
22	Mantenimiento de infraestructura de playas 2014	En ejecución

<sup>1</sup> <http://www.mpi.gob.pe/images/pdfs/MEMORIA%20DE%20CIERRE%20DE%20GESTION%20INSTITUCIONAL.pdf>



**Municipalidad Provincial de Ilo** ha publicado una nota.

4 de septiembre de 2014 a las 11:51

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO ENTREGA "REMOZADA LOSA DEPORTIVA 20 DE DICIEMBRE"**

Ilo 03 de Septiembre, Siendo las 17:00 hrs. La Municipalidad Provincial de Ilo, realizó la entrega a los vecinos de 20 de Diciembre, de la Obra de "MANTENIMIENTO Y PINTADO DE LA OLSA DEPORTIVA 20 DE DICIEMBRE", la misma que fue elogiada y bien recibida por sus moradores quienes expresaron su inmensa gratitud con la actual gestión municipal.

Cabe resaltar que ésta obra fue bajo un presupuesto inicial de S/. 299,749.08 Nuevos Soles, sin ampliación presupuestal, cuya fuente de financiamiento fue la de Canon y sobre canon. Cumpliéndose el plazo de ejecución de 97 días calendarios.

La Municipalidad Provincial de Ilo, comprometida con la juventud y con las actividades culturales hizo la entrega de ésta remozada y muy envidiable losa deportiva en una de las zonas principales y muy conocidas de nuestra localidad.

MPI - RRPP



El 10 de marzo del 2016 la Sub Gerencia de Programación e Inversiones aprueba los términos de referencia para la elaboración del estudio a nivel de perfil.

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto y Acord. Territorial  
Sub Gerencia de Programación e Inversiones (SGPI)

**INFORME N° 151-2016-SGPI-GRPPAT/GR.MOQ**

Eco. EDEN VICENTE CORI  
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acord. Territorial.

REMITO EVALUACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA  
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA ALM. 20 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE ILO-PROVINCIA ILO-REGION MOQUEGUA"

a) INFORME TÉCNICO N°044-2016-SGPI-GRPPAT/GR.MOQ  
b) INFORME N°280-2016-SGE-G8I/GR.MOQ

Moquegua, 11 de Marzo del 2016

La Sub Gerencia de Programación e Inversiones luego de la revisión, análisis y evaluación de los Términos de Referencia para la elaboración del estudio a nivel de Perfil considera:

Valor referencial	28.000.00 Nuevos Soles
Plazo de Ejecución	45 días calendarios

Por lo tanto se concluye **APROBAR** Los Términos de Referencia y se prosiga con los trámites correspondientes.

FECHA: Moquegua, 10 de Marzo del 2016

FIRMA: (Del evaluador y del Responsable de OPI)

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA  
Ing. Juan Erik Calero Reyes  
Sub Gerente de Programación e Inversiones

El 18 de enero de 2017 se aprobó el Informe técnico N° 002-2017-GRM7OREPLAN-OPI con la firma del evaluador y responsable del OPI.

 **GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA**

**INFORME TÉCNICO N° 002-2017-GRM/OREPLAN-OPI**

**TÍTULO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA LOSA DEPORTIVA, DEL AA.HH. 20 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA"**

CÓDIGO SNIP:	377536
NIVEL DE ESTUDIO:	PERFIL
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN (a Precios de Mercado)	S/, 1,994,570.65
UNIDAD FORMULADORA:	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
OPI RESPONSABLE:	OPI GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

**I. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN**

Habiéndose efectuado la revisión y análisis del proyecto en mención, se ha concluido que el resultado de evaluación final es **APROBADO**, por lo que se recomienda tener en cuenta las conclusiones y recomendaciones planteadas en el presente Informe, a fin proseguir con el estudio definitivo del PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA LOSA DEPORTIVA, DEL AA.HH. 20 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA"

**II. ANTECEDENTES**

### 3.2 RECOMENDACIONES

A fin de poder aprobar el estudio de pre-inversión "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA LOSA DEPORTIVA, DEL AA.HH. 20 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA", se deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones a fin de proceder al etapa de inversión.

- ✓ Se gestionen los documentos necesarios para la intervención del Proyecto, según los Compromisos asumidos por la Municipalidad Provincial de Ilo, de acuerdo al Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional de Moquegua y la Municipalidad Provincial de Ilo.
- ✓ Se deberá adjuntar en el Expediente Técnico, el Documento de Aprobación de la propuesta de la reubicación de la Estructuras 107-110 de la línea 13.8kv, de SPCC, por parte de la Dirección de Operaciones Ilo de la Empresa Southern Copper.
- ✓ Se recomienda continuar con los trámites correspondientes para la comunicación de la viabilidad del presente estudio de pre-inversión a la

  
**Profr. Ivonne Santillán Valdivia**  
 INGENIERO INDUSTRIAL  
 OPI 13027

"Mejoramiento de los Servicios de la Losa Deportiva, del AA.HH. 20 de Diciembre, Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Región Moquegua"


Dirección General de Inversión Pública - DGIPI del Ministerio de Economía y Finanzas-MEF. Para proseguir con la etapa de inversión del estudio.

- ✓ La Unidad Ejecutora (U.E.), debe ceñirse a los parámetros por los cuales fue otorgada la viabilidad, respetar el planteamiento técnico, los componentes y metas físicas contempladas en el estudio de Pre Inversión, para la elaboración del estudio definitivo y ejecución del PIP, en la fase de inversión.
- ✓ Proponer las medidas necesarias que permitan un adecuado control que garantice la operatividad del mismo en toda su vida útil.
- ✓ Aprobado el estudio de pre inversión, estos tendrán una vigencia máxima de tres (03) años, contados a partir de su aprobación por la OPI - REGIÓN MOQUEGUA, o de su declaración de viabilidad. Transcurrido este plazo sin haber prosiguido con la siguiente etapa del Ciclo del Proyecto, el estudio de pre inversión aprobado deberá volver a evaluarse. (Ref. artículo 40 de la Directiva del SNIP).
- ✓ La unidad Ejecutora deberá remitir luego de haber culminado el estudio definitivo o expediente técnico detallado acompañado con el respectivo Formulario SNIP 15, Informar al órgano que declaró la viabilidad del PIP, las montos de inversión y principales parámetros que se hayan considerado así como las variaciones que se pudiera haber realizado.

Fecha: 18 de Enero del 2017.  
 Firma: (Del evaluador y del Responsable de OPI)  
 Entidad:

  
**Profr. Ivonne Santillán Valdivia**  
 INGENIERO INDUSTRIAL  
 OPI 13027

  
**Profr. Ivonne Santillán Valdivia**  
 INGENIERO INDUSTRIAL  
 OPI 13027



### En el Estudio de pre inversión Capítulo III Identificación (Pág. 5)<sup>2</sup>, se indica los defectos sin mostrar las evidencias señaladas

“Actualmente existe una infraestructura deportiva que posee una antigüedad de más de 17 años de construida, la misma que por la inclemencia del clima costero, se encuentra deteriorada, presentando que el cerco se encuentre oxidado, los pisos de la losa deportiva de concreto presentan fisuras a nivel de losa”.



<sup>2</sup> En el ítem N° 5 <http://ofi4.mef.gob.pe/appFs/ListaPIP.aspx?pip=377536>

El 09 de octubre de 2018 se inicia la obra de la losa deportiva con recursos del Gobierno Regional, una inversión inusual ya que es una obra de índole municipal. En el documento de las audiencias públicas regionales 2019<sup>3</sup> (pág. 21) está indicado esta intervención.



**AUDIENCIAS PÚBLICAS  
REGIONALES 2019**

GENERAL SÁNCHEZ CERRO, MARISCAL NIETO E ILO

*Gobierno Regional Moquegua*



**APOYO COMUNAL - ILO**


MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA LOSA DEPORTIVA DEL AA.HH. 20 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA



**S/. 999,054**  
EJECUCIÓN


*Gobierno Regional Moquegua*

<sup>3</sup> [http://www.regionmoquegua.gob.pe/archivos/comunicados/audienciap/2019/AUDIENCIA%20PROVIN-CA%20%20ILO%202019\\_2019-12-20.pdf](http://www.regionmoquegua.gob.pe/archivos/comunicados/audienciap/2019/AUDIENCIA%20PROVIN-CA%20%20ILO%202019_2019-12-20.pdf)




## CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO POBLADO

El AA.HH. 20 de Diciembre se encuentra ubicado en el Puerto de Ilo (Cercado) y colinda con Marítimos, Costa Azul, Santa Rosa, Nylon y Upis Alto Ilo; consta de cinco manzanas y con una población aproximada de 90 habitantes, sin embargo en el expediente técnico consideran una población de 240 habitantes (Capítulo I, Resumen ejecutivo del proyecto).

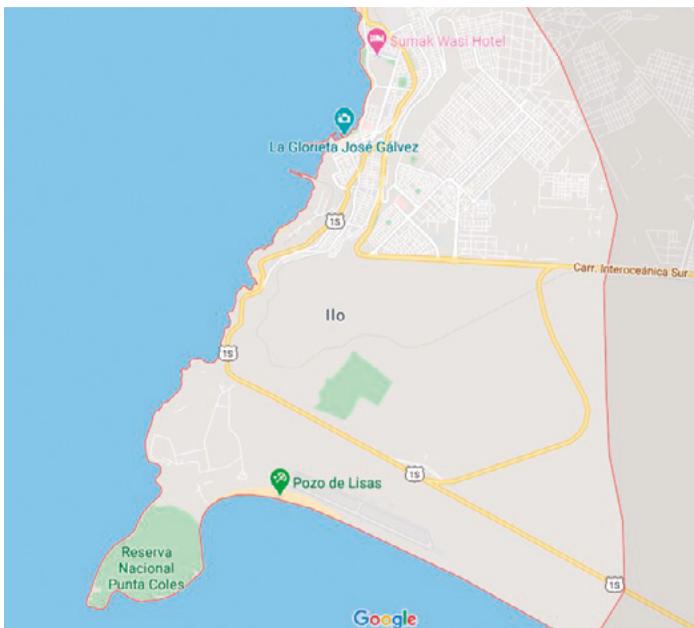

# PRESENTACIÓN DEL PROYECTO



## A. DATOS GENERALES

DATOS	HALLAZGOS
Nombre del proyecto	Mejoramiento de los servicios de la losa deportiva del AAHH. 20 de Diciembre, distrito de Ilo, provincia de Ilo, región Moquegua
Código único de inversiones	2338656
Código SNIP	377536
Fecha de registro	29/12/2016
Fecha de viabilidad	18/01/2017
Inicio de la obra	09/10/2018
Unidad evaluadora	OPI de la región Moquegua
Unidad formuladora:	Subgerencia de Estudios y Proyectos
Nivel de gobierno ejecutor	Región Moquegua- sede central Moquegua
Fuente de financiamiento	Canon y sobre canon, regalías, renta de aduanas y participaciones

## B. OBJETIVO DEL PROYECTO



Eficientes condiciones para la realización de actividades deportivas y recreativas en el AA.HH. 20 de Diciembre, distrito de Ilo, provincia de Ilo, región Moquegua.

## C. POBLACIÓN BENEFICIARIA

Número de los beneficiarios directos: 675 personas.

**Característica de los beneficiarios:** La población beneficiaria corresponde a la población en edad de realizar actividades deportivas y recreativas; su actividad económica se basa fundamentalmente en las actividades de pesca, comercio y transporte, asimismo cuentan con servicios básicos de agua, desagüe y luz, servicio de cable e internet en su gran parte.



## D. DEL PROYECTO

### DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consta de tres componentes: Infraestructura, equipamiento y capacitación.

### COMPONENTES

#### Componente 1. Infraestructura

Considera demoliciones, obras preliminares, seguridad y salud (desmontaje de cerco perimétrico existente de 138.09 ml., reubicación de línea de 13.8 KV fundición - Coquina, demolición de cimientos de cerco perimétrico de 138.09, demolición de la losa deportiva en un área de 748.63 m<sup>2</sup>, piso de concreto en un área de 292.00 m<sup>2</sup>, desmontaje de cobertura metálica en 140.00 m<sup>2</sup>), trabajos en losa deportiva (se instalarán 748.52 m<sup>2</sup> de gras sintético, pintado de graderías en 324.00 m<sup>2</sup>, mejoramiento en zona de barbacoa con instalación de cinco bancas, construcción de cobertura de planchas de polipropileno en 48.00 m<sup>2</sup>, mejoramiento de zona de batería de servicios higiénicos, acondicionamiento de un depósito de 4.5 m<sup>2</sup>), veredas perimetrales (construcción de veredas exteriores perimetrales proyectada en 229.29 m<sup>2</sup>), cerco perimétrico, estructura de metal, cobertura (construcción e instalación de 828.54 m<sup>2</sup> de cerco metálico con malla galvanizada, construcción de tres pórticos de ingreso, con puertas metálicas, construcción de cobertura en la zona de losa deportiva en un área de 1,400 m<sup>2</sup>), instalaciones sanitarias (mantenimiento y cambio de aparatos sanitarios, conexiones de puntos de agua), instalaciones eléctricas (cambio de todo el sistema de alumbrado interior en los ambientes existentes y proyectados, instalación de 15 reflectores de halogenuro metálico), plan de manejo ambiental.

## Componente 2. Equipamiento

Mobiliario, equipamiento, instalación de 265 asientos de fibra, instalación de dos arcos, instalación de parantes metálicos para vóley, suministro de equipos, materiales e insumos para el mantenimiento del gras sintético, instalación de un juego modular en la zona de parrillas.

## Componente 3. Capacitación

Capacitación y sensibilización en temas de manejo y operación de infraestructura deportiva.

## JUSTIFICACIÓN

Elevar la calidad de vida de la población del AA.HH. 20 de Diciembre.

## E. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Monto viable	S/ 1'994,571.00
Monto actualizado	S/ 2'674,140.23
Monto ejecutado acumulado	S/ 1'787,944.34
Primer y último mes de ejecución financiera	Marzo 2018 y junio 2020
Avance físico	48.76%

## F. CONTRATACIONES

Ejecutora: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA, UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO N° 003

CONTRATISTA	TIPO DE PROCESO	CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MONTO DE SUSCRIPCIÓN
<b>10046457329</b> LOPE QUISPE ELOY	Adjudicación simplificada	<b>708</b> Servicio de confección e instalación de pérgola de madera a todo costo	26/08/2019	S/ 57,800
<b>20448498361</b> CONTRATISTAS Y CONSULTORES GENERALES CMG E.I.R.L.	Adjudicación simplificada	<b>009-2019-GSRD.ILO-UE/GRM</b> Servicio de suministro fabricación e instalación de estructura metálica y cobertura, incluye mano de obra, materiales, equipos y herramientas	11/12/2019	S/ 105,999

En el cuadro siguiente se muestran las contrataciones disgregado en bienes y servicios<sup>1</sup>

## Contrataciones: Procedimientos de selección

Código único: 2338656.

Tipo de inversión: PIP mayor (SNIP).

Nombre de la inversión: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA LOSA DEPORTIVA DEL AA.HH. 20 DE DICIEMBRE DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA.

Modalidad de ejecución: Administración directa.

### BIENES: 3

TIPO DE PROCESO	NOMENCLATURA	DESCRIPCIÓN DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE ÍTEM	NÚMERO DE ÍTEM	FECHA DE CONVOCATORIA	ESTADO	VALOR REFERENCIAL (S/)
Adjudicación simplificada	AS-SM-9-2019-OEC/SRDI-1	Adquisición de grass sintético incluye instalación	Adquisición de grass sintético incluye instalación	1	30/10/2019	 Cancelado	115,000
Licitación pública	LP-SM-1-2019-CS-SRDI-1	Contratación de estructura metálica para cobertura con plancha de policarbonato de 10mm. incluye instalación eléctrica	Contratación de estructura metálica para cobertura con plancha de policarbonato de 10mm. incluye instalación eléctrica	1	20/08/2019	 Nulo	580,000
Adjudicación simplificada	AS-SM-1-2019-OEC/SRDI-1	Cerco metálico con malla galvanizada incluye confección e instalación	Adquisición de cerco metálico con malla galvanizada plastificada 2" x 2", incluye confección e instalación	1	11/06/2019	 Contratado	67,800

### SERVICIOS: 3

TIPO DE PROCESO	NOMENCLATURA	DESCRIPCIÓN DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE ÍTEM	NÚMERO DE ÍTEM	FECHA DE CONVOCATORIA	ESTADO	VALOR REFERENCIAL (S/)
Adjudicación simplificada	AS-SM-7-2019-CS/SRDI-1	Servicio de suministro, fabricación e instalación de estructura metálica y cobertura. Incluye mano de obra, materiales, equipos y herramientas para mejorar los servicios de educación inicial no escolarizado IE N° 274- Divino Niño Jesús	Servicio de suministro, fabricación e instalación de estructura metálica y cobertura. Incluye mano de obra, materiales, equipos y herramientas	1	04/11/2019	 Contratado	130,000
Adjudicación simplificada	AS-SM-2-2019-OEC/SRDI-2	Contratación del servicio de confección e instalación de pérgola de madera a todo costo	Servicio de confección e instalación de pérgola de madera a todo costo	1	16/07/2019	 Contratado	68,250
Adjudicación simplificada	AS-SM-2-2019-OEC/SRDI-1	Contratación del servicio de confección e instalación de pérgola de madera a todo costo	Servicio de confección e instalación de pérgola de madera a todo costo	1	26/06/2019	 Desierto	68,250

<sup>1</sup> <https://ofi5.mef.gob.pe/repseguim/proyinv16.html?codigo=2338656>

## g. INFORMACIÓN DE OBRAS

Solo figuran las dos (02) contrataciones. En las contrataciones no se indica las compras de materiales de construcción (Arena, hormigón, piedra chancada, fierro corrugado, ladrillo, cemento), alquiler de maquinaria y equipo, combustible.

Hay error en el ingreso de data. El contratista con RUC N° **20448498361**, Contratistas y Consultores Generales CMG E.I.R.L. corresponde a la contratación realizada para la entidad educativa inicial N° 274 Divino Niño Jesús (Cód. SNIP: 2320556) por S/ 105,999.00, pero está considerado en el SSI del MEF en las contrataciones de esta obra.

Con respecto al contratista con RUC **10046457329**, Lope Quispe Eloy, no se tiene acceso al contrato, en su lugar solo se muestra una Resolución de Gerencia Sub Regional N° 078-2019-GSRD.ILO-UE/GRM, del 23 de julio del 2019 que indica generalidades sobre el nombramiento del comité de selección.

# ANÁLISIS

## ¿Qué nos preocupa?

- ▶ El monto presupuestado y empleado en la demolición de la losa deportiva anterior S/ 132,508.29
- ▶ El proyecto estaba previsto para culminar en 120 días y se ha incrementado a 357 días, el triple del tiempo.
- ▶ Hubo dos (02) residentes e inspectores de obra. Se ha cambiado a la Gerente de la Sub Región de Desarrollo de Ilo.
- ▶ El monto inicial del presupuesto fue S/ 1'994,571.00 actualmente es de S/ 2'674,140.23.
- ▶ Los montos calculados fueron para una modalidad de ejecución de administración presupuestaria indirecta - por contrata y se ha cambiado a administración directa.
- ▶ El costo de la reubicación de la línea de 13.8 KV fundición – Coquina entre los Postes P107 al P110 se ha incrementado de S/ 80,826.92 a S/ 345,269.64.
- ▶ Los costos indirectos no están de acuerdo a la normatividad vigente (Resolución Ejecutiva Regional N° 174-2019-GR/MOQ del 10/04/2019).
- ▶ En la infraestructura desde el mes de marzo de 2018 a la fecha, el proyecto se encuentra paralizado en sus actividades físicas, porque no existe fecha de reubicación de la línea de media tensión, debido a que la empresa privada (Southern Perú) no tiene fecha de reubicación de la línea de media tensión.

---

## EVALUACIÓN DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIONES

---

Ejecutoras:

1. Región Moquegua – Sede Central – Moquegua.

- ▶ 2018: Marzo a julio.

## 2. Región Moquegua – Sub Región Desarrollo ILO – Moquegua.

- ▶ 2018: Julio a diciembre.
- ▶ 2019: Febrero a diciembre.
- ▶ 2020: Marzo a la fecha.

## PARALIZACIONES

Si, por la falta de presupuesto asignado y el retiro del cableado de postes de media tensión que atraviesa la obra. Además, por la pandemia de la Covid-19.

## EVALUACIONES DE CONTRATACIONES REALIZADAS

Solo hay información de una contratista y otra que está colocado incorrectamente. Lo relacionado a los materiales de construcción, maquinaria y equipo y combustible no se muestran.

## AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA

Registro en el Banco de Inversiones con Informe N° 312-2019-GPM-RO/SGIP-GRM del 04/09/2019.

<b>I. MEMORIA DESCRIPTIVA</b>	
<b>1.1. DATOS DE LA OBRA</b>	
Código InvertePe	: 2338656
Costo de perfil técnico	: S/. 1'964,571.00 soles
Proyecto	: "Mejoramiento de los servicios de la losa deportiva del AA.HH. 20 de Diciembre, distrito de Ilo, provincia de Ilo, región Moquegua".
Costo de expediente técnico original	: S/. 2'326,092.46 soles.
Costo de expediente técnico Modificado	: S/. 2'674,140.23 soles
Plazo de ejecución inicial	: 120 días calendario.
Plazo de ejecución reprogramado	: 357 días calendario.
Modalidad de ejecución	: Ejecución Presupuestaria Directa.
Meta presupuestal 2019	: 0035
Fuente de financiamiento	: Recursos ordinarios / Canon Minero
Unidad ejecutora	: Sub región de desarrollo Ilo – Sub Gerencia de Infraestructura Publica
<b>1.2. INSTITUCIONALIDAD</b>	
Gerente Sub Regional	: Ing. Lucas Bautista Cruz
Sub gerente de Infraestructura	: Ing. Rene Arnaldo Vargas Mamani
Residente de obra N° 01	: Arq. Teofilo Calderón Molina (03/10/2018 @ 31/12/2018)
Residente de obra N° 02	: Ing. Gilberto Pérez Machaca (10/04/2019 @ actualidad)
Inspector de obra N° 01	: Ing. Javier Orocoñez Pinto (09/10/2018 @ 31/12/2018)
Inspector de obra N° 02	: Ing. Francisco Pacoricóna Villasante (10/04/2019 @ actualidad)
Proyectistas	: Ing. Jesus Choquegonza Condori (General), Arq. Erika Salinas Ticona (Arquitectura), Ing. Jesus Choquegonza Condori (Estructuras), Ing. Luis Meneses Mamani (Instalaciones Eléctricas), Ing. Jesus Choquegonza Condori (Instalaciones Sanitarias).

MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA 20 DE DICIEMBRE

ING. CELSO VILLYS MAMANI

---

## PROBLEMAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA

---

No se puede evaluar por la coyuntura actual y además porque la obra se encuentra paralizada.

### OPINIONES Y EXPECTATIVAS DE LA POBLACIÓN, BENEFICIARIOS, AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS

#### NOTICIAS

##### **11 Jun 2019 Prensa regional<sup>2</sup>**

Jorge Lama, vicegobernador de la región Moquegua, se refirió a los avances de la obra “Mejoramiento de los servicios de la Loza Deportiva, del AA.HH. 20 de Diciembre en el Puerto de Ilo”, en donde existe pendiente resolver el tema del retiro de la línea de alta tensión de la empresa Southern Perú, que actualmente atraviesa el lugar donde se ejecuta los trabajos y se tiene previsto colocar coberturas de protección contra los rayos UV.

##### **Subregión-ILO ILO<sup>3</sup>**

El gobierno regional de Moquegua a través de la Sub Región Ilo reinició los trabajos de la obra denominada “Mejoramiento de la Losa Deportiva del AA.HH. 20 de Diciembre, distrito de Ilo, provincia de Ilo”, que se inició en el mes de octubre del 2018, pero la gestión regional anterior no la consideró en el Presupuesto Inicial de Apertura – PIA 2019 y quedó paralizada. Tras una serie de coordinaciones para buscar el financiamiento y que esta obra no siga paralizada, la Sub Región Ilo logró una inyección presupuestal para continuar con estos trabajos por ejecución presupuestal directa. Según el expediente técnico el monto de inversión es de S/ 2'326,092.44, para un plazo de ejecución de 120 días, iniciado el 09 octubre 2018 y debió culminar el 05 febrero del 2019, sin embargo ahora se ha reiniciado los trabajos de la misma desde el pasado 10 de abril .

---

<sup>2</sup> <https://www.prensaregional.pe/region-moquegua/ilo-provincia/ilo-ilo/gore-moquegua-y-trabaja-peru-ejecutaran-proyectos-de-arborizacion-en-el-algarrobal/>

<sup>3</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=QEdSL0kd92A>

### **Avanza mejoramiento de losa deportiva de “20 de Diciembre”**

Por: La Prensa Regional, 15 de agosto de 2019

Un 31% registra el avance físico de la obra “Mejoramiento de los servicios de la losa deportiva en el AA.HH. 20 de diciembre”, con la instalación del cerco perimétrico con malla metálica manifestó el Ing. Gilberto Pérez Machaca, responsable de los trabajos que ejecuta la Sub Región Ilo.

Señaló que en la presente semana se culminará la colocación del cerco perimétrico que especifica el proyecto, además se espera culminar en breve los trabajos complementarios de estucados en fachada e interiores como son las graderías y espacios recreativos, servicios higiénicos y cocina, quedando pendiente la reubicación de postes de media tensión.


Precisó que el gran porcentaje y trabajos puntuales se presentará en la duración de los procesos e instalación de las coberturas, gras sintético y pérgolas, por lo que ya se tiene gestiones administrativas muy avanzadas, sin embargo, además el tema técnico dependerá de la reubicación de las antiguas líneas de media tensión que existe en la zona.

Cabe recordar que el expediente técnico de la obra en general tiene un monto de inversión de S/ 2'326,092.44, en tres componentes como son de infraestructura, mobiliario y capacitación, por lo que se viene ejecutando dentro del plazo establecido de 120 días, esperando culminar los trabajos a fines de noviembre, indicó.

# CONCLUSIONES

- ▶ En el Estudio de pre-inversión Capítulo III Identificación no se hace un análisis enfocado sobre la población objetivo (AA.HH. 20 de Diciembre), se habla sobre Ilo y Moquegua. Tampoco se hace mención que esta losa deportiva estaba operativa y funcionando sin muchos problemas ya que había sido intervenida en el 2014 por la Municipalidad Provincial de Ilo, en las fotos que muestran no se ve nada sobre los pisos de la losa deportiva de concreto, donde indican que presenta fisuras a nivel de losa, tampoco se muestra la oxidación de la malla, sólo se observa en la parte exterior, en la base de la construcción cierto deterioro, lo que no afecta la operatividad de esta área recreativa.
- ▶ Los costos del proyecto para la demolición de la losa deportiva, servicios higiénicos y área de eventos se elevaron. En la pág. 5 del Estudio de pre-inversión se indica que “La zona de las graderías se encuentra en regular estado, por lo que se plantea un pintado a fin de mantener y preservar su operatividad”, pero estas graderías fueron demolidas completamente.
- ▶ Otro aspecto importante es que antes de iniciar el proyecto se debía haber priorizado primero el retiro de la línea de media tensión que pasa por encima de la obra, que chocará al colocar la cobertura, lo cual actualmente es un peligro y una de las limitaciones de la ejecución de la obra. No se tiene acceso al expediente técnico del proyecto para saber cuál ha sido la ruta crítica para el retiro de la línea de media tensión.
- ▶ El proyecto está casi a la mitad de avance (48.76%) de la obra. Actualmente se encuentra paralizado.
- ▶ Falta el retiro de la línea de media tensión, que aún continua en gestiones. No se tiene información de la empresa Southern respecto al tema. Por la pandemia no se ha podido solicitar esta información a la empresa minera.
- ▶ El tiempo de ejecución se planteó culminar en 120 días, actualmente se ha incrementado a 357 días. Se ha incrementado el plazo de ejecución al triple del plazo de ejecución inicial. El residente de obra indica plazos de posible término pero que no se cumple. Ahora con el problema de la pandemia de la Covid-19 se hace más crítica su conclusión por los protocolos de bioseguridad que se tienen que implementar.
- ▶ La actividad relacionada con el retiro de la línea de media tensión de 13.8 KV Fundición - Coquina ha incrementado su costo de S/ 80,826.92 a S/ 345,269.64 y no se ve ningún avance con la empresa privada Southern Peru que tiene injerencia en esto.
- ▶ El avance financiero está en S/ 1'303,848.97 teniendo el costo actualizado a S/ 2'674,140.23.

# RECOMENDACIONES



---

## PARA LA AUTORIDAD O ENTE EJECUTOR

---

- ▶ Implementar los protocolos de bioseguridad durante el proceso de construcción.
- ▶ Coordinar con el Comité de Vigilancia del PPR (Presupuesto Participativo Regional) para darle las facilidades en su proceso de seguimiento y monitoreo de la obra. Dar la información sobre las gestiones realizadas y acciones inmediatas con la empresa Southern Perú para el retiro de la línea de media tensión que impide la colocación de la cobertura en la losa deportiva.
- ▶ Sincerar la información colocada en el SEACE respecto a los contratos sobre los tres componentes del PIP, ya que no aparecen los gastos por los materiales de construcción y alquiler de equipos.
- ▶ Tener personal capacitado para el ingreso de información porque hay ingreso de data incorrecta.
- ▶ Informar sobre las acciones realizadas para el residente de obra anterior respecto a la documentación faltante, según manifiesta el nuevo residente de obra, quien además explica que la obra se iba culminar en el mes de julio de 2019.
- ▶ En los carteles de obra se debe colocar el código único de inversiones o código SNIP, a fin de que la ciudadanía que desee vigilar pueda acceder rápidamente usando las herramientas del SSI del MEF.

---

## PARA LOS ENTES DE FISCALIZACIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

---

- ▶ La población objetivo a través de su Comité de Gestión debe hacer suyo el proyecto y mostrar el interés y vigilancia del mismo.
- ▶ Las entidades involucradas en este proyecto (Gobierno regional y Municipalidad Provincial de Ilo) deben ser muy transparentes y cumplir con los plazos y presupuestos previstos. Además, realizar las acciones y gestiones ante la empresa minera.
- ▶ Los consejeros y regidores deben cumplir con sus funciones de fiscalización en relación a este proyecto.
- ▶ La Contraloría General de la República debe realizar la auditoría correspondiente a este proyecto.

## SOCIOS DEL GRUPO PROPUESTA CIUDADANA



Asociación  
ARARIWA



Centro de Estudios  
para el Desarrollo  
Regional - CEDER



Centro de Estudios  
para el Desarrollo y  
la Participación - CEDEP



Centro de Estudios  
Regionales Andinos  
"Bartolomé de las  
Casas" - CBC



Centro de Estudios  
y Promoción del  
Desarrollo - DESCO



Centro Ecuménico  
de Promoción y  
Acción Social Norte -  
CEDEPAS NORTE



Centro de Investigación  
Social y Educación  
Popular - ALTERNATIVA



Centro de Investigación  
y Promoción del  
Campesinado - CIPCA



Centro Peruano de  
Estudios Sociales -  
CEPES



Instituto de Estudios  
Peruanos - IEP



[www.propuestaciudadana.org.pe](http://www.propuestaciudadana.org.pe)  
Teléfonos: 920 860 005  
[contacto@propuestaciudadana.org.pe](mailto:contacto@propuestaciudadana.org.pe)
